

## CONTRACT

de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie  
a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire  
nr. 05/02-07/11

15.05. 2023

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare - Companie), reprezentată de către dna Doina – Maria Rotaru, director general adjunct, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Finanțator” și Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Călărași”, reprezentată de către dl Vitalie Triboi, șef, care acționează în baza Regulamentului, denumită în continuare „Beneficiar” au încheiat Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire (în continuare - Contract), convenind asupra următoarelor.

### 2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului Contract reprezintă realizarea de către Beneficiar a activităților în cadrul Proiectului intitulat: *„Profilaxia și prevenirea riscurilor de traumatizare, deces a populației, în special a copiilor și adolescenților ca urmare a accidentelor rutiere”*, (în continuare Proiect), în baza finanțării acordate de Finanțator.

2.2. Beneficiarului i se va acorda finanțarea în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

2.3. Beneficiarul își asumă obligația de a implementa activitățile incluse în Proiect, iar Finanțatorul de a le achita conform prevederilor anexei nr.2 „Bugetul de cheltuieli al proiectului” și anexa nr.3 „Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor”.

2.4. Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și conform actelor normative, inclusiv Ordinul ministerului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.286/154-A/2017 *„Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”*.

2.5. La încheierea acestui Contract reprezentantul Beneficiarului în relațiile contractuale cu Compania semnează Declarația pe propria răspundere, conform Anexei nr.4 la Contract precum că, documentele, rapoartele, informațiile menționate în listele beneficiarilor de servicii prestate în cadrul Contractului prenotat sunt veridice.

### 3. Durata și condițiile de implementare a Proiectului

3.1. Contractul se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către Părți fiind valabil până la data de 31 decembrie 2023.

3.2. Data începerii implementării Proiectului este 15 mai 2023.

3.3. Realizarea activităților se efectuează potrivit Proiectului, Bugetului de cheltuieli al proiectului și Graficului tranșelor (Anexa nr.1, Anexa nr.2 și Anexa nr.3 la Contract).

3.4. Proiectul se implementează de către Beneficiar până la data de 30 iunie 2023.

3.5. Eliberarea resurselor financiare în cadrul acestui Contract, poate să nu fie realizată de către Finanțator, în cazul nerespectării de către Beneficiar a termenilor și condițiilor acestui Contract și atingerea rezultatelor scontate.

3.6. Sumele neutilizate, utilizate contrar destinației sau utilizate în lipsa documentelor

justificative/confirmative, se returnează Finanțatorului după finalizarea proiectului, în termen de 3 zile de la data expirării Contractului.

#### 4. Valoarea contractului și condițiile de plată

4.1. Valoarea totală a Contractului constituie **194 640,0 lei**.

4.2. Valoarea totală a Contractului nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia.

4.3. Beneficiarul va utiliza mijloacele financiare acordate de către Finanțator în strictă conformitate cu prevederile Proiectului și ale Bugetului. Variațiile la oricare din liniile de buget, cu anexarea explicațiilor și argumentelor, fără modificarea sumei contractuale care ar putea fi necesară pentru implementarea eficientă și cu succes a Proiectului vor fi operate doar cu acordul în scris al Finanțatorului expediat în termen de până la 5 zile lucrătoare, în baza cererii scrise a Beneficiarului.

4.4. Finanțatorul poate efectua finanțarea proiectului, în baza cererii argumentate a Beneficiarului, însoțită de documente justificative/confirmative și descrierea activităților planificate, în mărime de până la 80 % din tranșă. Cererea argumentată va fi depusă în scris, în conformitate cu graficul tranșelor, specificat în anexa nr.3 la Contract. Restul mijloacelor financiare vor fi achitate de către Finanțator, în baza facturii, după prezentarea documentelor confirmative privind activitățile realizate în cadrul Proiectului (modelele rapoartelor sunt stabilite în anexele nr.5a-5c). La cererea în scris a Beneficiarului, Finanțatorul poate diviza tranșa, efectuând plățile în mai multe subtranșe.

4.5. Achitarea plăților Beneficiarului pentru serviciile prestate se va efectua de către Finanțator în lei moldovenești, în termen de 14 zile calendaristice de la data prezentării tuturor documentelor justificative/confirmative. În cazul neprezentării documentelor justificative/confirmative, certificate prin semnătura electronică sau olografă a Beneficiarului și, după caz a persoanelor beneficiare ale Proiectului, privind utilizarea mijloacelor financiare pentru implementarea Proiectului sau raportării eronate de către Beneficiar, acest termen se suspendă pentru trei zile, timp în care Beneficiarul este obligat să prezinte documentele și rapoartele justificative/confirmative, solicitate de către Finanțator.

Documentele justificative/confirmative vor fi prezentate în copie autenticată de Beneficiarul de finanțare prin semnătură, cu mențiunea „*conform originalului*”.

4.6. Finanțatorul poate suspenda sau refuza finanțarea proiectului, în cazul în care Beneficiarul nu prezintă conform clauzelor contractuale raportul integral și documentele justificative/confirmative în termenul solicitat de Finanțator.

În cazul înregistrării unui sold la contul Beneficiarului, constituit din mijloacele financiare obținute în cadrul implementării Proiectului, Finanțatorul suspendă efectuarea plăților planificate.

4.7. Nu se acceptă folosirea resurselor financiare pentru activități care nu corespund scopului, obiectivelor și liniilor bugetare ale proiectului. În cazul utilizării contrar prevederilor prezentului Contract a mijloacelor financiare, Finanțatorul este în drept să aplice una din următoarele forme de penalizare:

a) să micșoreze următoarea finanțare în cadrul Proiectului cu suma utilizată contrar prevederilor Contractului, sau

b) să solicite Beneficiarului să returneze în contul Finanțatorului suma utilizată contrar prevederilor Contractului, în decurs de 5 zile de la recepționarea de către Beneficiar a cererii Finanțatorului de returnare a sumelor date.

4.8. Sunt eligibile pentru a fi acoperite doar cheltuielile prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Contract.

4.9. Sumele pe care Beneficiarul s-a angajat să le depună din mijloacele proprii, sumele care sau angajat să le depună alți cofinanțatori, precum și penalitățile, amenzile etc., nu sunt eligibile pentru plată de către Finanțator.

4.10. Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Beneficiarului.

4.11. Dacă Beneficiarul nu respectă obligațiile prevăzute în prezentul Contract, demonstrând o utilizare necorespunzătoare a resurselor sau bunurilor și serviciilor finanțate din mijloacele FAOAM, Finanțatorul poate solicita Beneficiarului să ramburseze (integral sau parțial), în decurs de 5 zile de la data primirii cererii de rambursare, mijloacele financiare utilizate pentru achiziționarea



acestor bunuri sau servicii.

4.12. În cazul rezoluțiunii Contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale privind implementarea Proiectului, Beneficiarul este obligat să returneze Finanțatorului, în termen de maximum 5 zile calendaristice, sumele cheltuielilor care nu sânt justificate.

## **5. Evidența și controlul utilizării mijloacelor financiare**

5.1. Pe parcursul executării contractului de finanțare, Beneficiarul are obligația să prezinte Finanțatorului, conform termenului stabilit în anexa nr.3, următoarele rapoarte cu respectarea formularelor standard anexate la prezentul Contract:

- a) Raport financiar reprezintă activitatea financiară în decursul implementării proiectului, bugetul aprobat, finanțat și executat, precum și devierile cheltuielilor. Raportul financiar se completează în baza Formularelor din anexa 5a și 5b și va include copiile documentelor primare (factură, ordin de plată, foi de parcurs, etc.) pentru verificare.
- b) Raportul narativ final de activitate reprezintă sumarul activităților implementate pe parcursul proiectului (inclusiv date calitative și cantitative privind beneficiarii acoperiți cu servicii) și cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea, cât și contribuția proprie, după caz, include o analiză a rezultatelor proiectului, indicatorilor atinși/neatinși, devierile de la activitățile proiectului (dacă există), realizările, provocările și acțiunile întreprinse pentru a le soluționa. Raportarea activităților se face în baza formularului tip al Finanțatorului din anexa 5c.

5.2. Pe parcursul implementării proiectului Beneficiarul informează Finanțatorul despre toate evenimentele importante, care pot influența pozitiv sau negativ realizarea proiectului.

În cazul în care ar putea exista devieri în implementarea proiectului în raport cu planul de activități, acestea trebuie explicate și argumentate prin intermediul unei scrisori adresate Finanțatorului prin care se solicită aprobarea modificărilor propuse.

5.3. Rapoartele cu privire la realizarea proiectului se depun atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, fiind însoțite de documentele justificative/confirmative pentru cheltuielile efectuate pe fiecare linie de buget.

5.4. Rapoartele narrative și financiare pe tranșe se prezintă conform graficului tranșelor.

5.5. Finanțatorul are dreptul de a efectua verificări, atât în perioada derulării Contractului, cât și ulterior validării raportului final.

5.6. În cazul realizării verificării la fața locului, Beneficiarul are obligația de a prezenta Finanțatorului toate informațiile și actele necesare desfășurării eficiente a verificării. În cazul în care Beneficiarul refuză prezentarea informației solicitate de către Finanțator, pentru stabilirea veridicității datelor expuse în informație, Finanțatorul are dreptul să refuze achitarea.

5.7. Curtea de Conturi este abilitată cu dreptul de a exercita controlul financiar asupra derulării Proiectului și executării Contractului.

## **6. Obligațiile și responsabilitățile părților**

6.1 Finanțatorul are obligația să asigure plata pentru implementarea Proiectului, respectând condițiile, modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.2 Beneficiarul are următoarele obligații:

- a) să asigure implementarea calitativă a Proiectului în conformitate cu prezentul Contract, fiind unicul răspunzător în fața Finanțatorului pentru implementarea Proiectului;
- b) să acopere cheltuielile asumate conform anexei nr.2 din sursele proprii;
- c) să asigure informarea în prealabil a Finanțatorului privind activitățile ce urmează a fi implementate, prin e-mail la adresa oficială a CNAM ([secretariat@cnam.gov.md](mailto:secretariat@cnam.gov.md));
- d) să prezinte toate documentele justificative/confirmative privind utilizarea mijloacelor pe acest proiect (facturi fiscale, contracte, documente bancare, ordinele de plată, etc.) cu descifrarea pe elementele de cheltuieți. În cazul neprezentării sau prezentării în volum incomplet în termenii stabiliți a documentelor solicitate, Finanțatorul are dreptul să micșoreze bugetul proiectului la volumul respectiv;
- e) să gestioneze veniturile și cheltuielile bugetului pentru implementarea proiectului prin conturi

- bancare separate;
- f) să utilizeze mijloacele financiare integral și exclusiv în modul și pentru destinațiile care au fost aprobate și care sunt indicate în Proiect (anexa nr.1) și bugetul de cheltuieli al proiectului (anexa nr.2);
  - g) să restituie Finanțatorului mijloacele financiare utilizate în alte scopuri decât realizarea prezentului contract sau cheltuielile raportate, dar neargumentate documentar;
  - h) să restituie Finanțatorului bunurile raportate la mijloace fixe, procurate din contul mijloacelor financiare obținute în baza prezentului Contract, care nu sunt folosite în corespundere cu prevederile acestuia;
  - i) să asigure utilizarea eficientă a mijloacelor financiare obținute conform prezentului Contract. În cazul procurării din aceste mijloace a mărfurilor și serviciilor, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului, cu titlu informativ, până la procurarea de către el a mărfurilor sau plata serviciilor, documentele ce atestă modul de selectare a mărfurilor sau serviciilor agentului economic, și anume:
    - ofertele agenților economici (nu mai puțin de trei), care au fost examinate la alegerea mărfurilor sau serviciilor (ofertele trebuie să conțină adresa și telefonul ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei), certificatele de înregistrare a agenților economici, certificatele de proveniență a mărfii, certificatele de calitate și alte documente necesare pentru selectarea agentului economic câștigător;
  - j) să prezinte la cererea Finanțatorului, în caz de necesitate, informația privind datele incluse în rapoartele prezentate altor finanțatori ce țin de implementarea proiectului;
  - k) să efectueze plata impozitelor aferente prezentului Contract în cazurile prevăzute de legislație;
  - l) să coordoneze cu Finanțatorul toate materialele informative, elaborate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. Termenul de coordonare pentru Finanțator este stabilit de până la 5 zile lucrătoare.
  - m) să expedieze Finanțatorului copiile tuturor publicațiilor efectuate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. În toate aceste publicații Beneficiarul va include următoarea declarație: „*Acest material este editat (realizat) cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină*”. Beneficiarul de asemenea este obligat să înștiințeze Finanțatorul despre toate conferințele de presă, seminare, manifestații sau alte evenimente sociale, legate de executarea proiectului finanțat, până la desfășurarea lor.

6.3 Finanțatorul nu poartă răspundere pentru veridicitatea și autenticitatea materialelor pasibile de citire și audiere produse de către Beneficiar utilizând mijloacele financiare acordate în baza prezentului Contract.

6.4 Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Finanțatorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților din culpa Beneficiarului.

6.5 Beneficiarul va asigura instruirea personalului în toate ariile de responsabilitate, precum și va garanta că personalul implicat va participa la sesiunile de formare organizate în acest scop.

6.6 Beneficiarul confirmă faptul, că activitățile sale sunt efectuate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

6.7 În cazul utilizării mijloacelor FAOAM în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, beneficiarul poartă răspundere potrivit legii.

## **7. Forța Majoră**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de Forța Majoră.

7.2. Prin cazuri de Forța Majoră se subînțelege: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

7.3. Survenirea circumstanțelor de Forța Majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la Forța Majoră, eliberat de organul

competent din Republica Moldova.

## **8. Rezoluțiunea contractului**

8.1. Rezoluțiunea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor Părți sau la inițiativa uneia din Părți.

8.2. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în timp de 5 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile de la recepționarea intenției de rezoluțiune a contractului, în caz contrar partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul rezoluționat.

8.4. Rezoluțiunea prezentului Contract din inițiativa Finanțatorului, poate avea loc în cazul în care Beneficiarul nu respectă condițiile prezentului Contract sau ale Proiectului, fiind notificat Beneficiarul cu cel mult 5 zile calendaristice înainte de data rezoluțiunii Contractului .

8.5. Finanțatorul își rezervă dreptul să rezoluționeze Contractul de finanțare, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele acordate până în acel moment, în cazul în care mijloacele financiare transferate de către finanțator sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în contractul de finanțare.

## **9. Reclamații și sancțiuni**

9.1. Pentru implementarea cu întârziere a Proiectului, din vina Beneficiarului, acesta poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din valoarea Proiectului, pentru fiecare zi de întârziere.

9.2. Pentru achitarea cu întârziere a plății tranșelor, Finanțatorul poartă răspundere materială în valoare de 0.01% din suma neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

9.3. Pentru refuzul oricărei dintre părți de a executa acțiunile, serviciile, activitățile prevăzute în prezentul Contract, acesta suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a Contractului.

## **10. Dispoziții finale**

10.1. Acțiunea prezentului Contract încetează la finalizarea de către Beneficiar a proiectului și prezentarea raportului financiar final și a raportului cu privire la executarea proiectului. La prezentarea lor, Finanțatorul va efectua, după caz, achitarea plăților restante față de Beneficiar sau va solicita Beneficiarului întoarcerea mijloacelor oferite în baza prezentului Contract, rămase neutilizate în procesul realizării proiectului. Raportul cu privire la executarea proiectului va conține toată informația despre rezultatele obținute ca urmare a realizării proiectului.

10.2. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, în caz de divergențe vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

10.3. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența anterioară referitoare la acesta, își pierd puterea juridică.

10.4. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost semnate de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor părți.

10.5. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul înscris al celeilalte părți.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în doua exemplare care se remit câte un exemplar:

- 1) Finanțatorului.
- 2) Beneficiarului.

10.7. Întru confirmarea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract la data de **15 mai 2023.**

### **Anexe:**

- Anexa nr.1: Proiectul;
- Anexa nr.2: Bugetul de cheltuieli al proiectului;
- Anexa nr.3: Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor;
- Anexa nr.4: Declarația pe propria răspundere.

**Formularele de raportare, după cum urmează:**

Anexa 5a: Raport financiar generalizat;

Anexa 5b: Raport financiar detaliat;

Anexa 5c: Raport narativ final de activitate.

Anexele nr.2 și nr. 3 ale prezentului Contract vor fi semnate și ștampilate de către reprezentanții autorizați în mod corespunzător de către Beneficiar și Finanțator.

**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

<b>FINANȚATOR</b>	<b>BENEFICIAR</b>
<b>Adresa poștală:</b> mun. Chișinău, bl. Vlaicu Pircălab, 46 <b>Telefon/Fax:</b> 022 780 240 <b>IBAN:</b> MD73TRPEAB518720A01857AA <b>Banca:</b> Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat <b>Cod bancar:</b> TREZMD2X <b>Cod fiscal:</b> 1007601007778	<b>Adresa juridică/poștală:</b> MD-4401, str. Bojole nr.1, or.Călărași <b>Telefon/Fax:</b> 0244 2-26-60; 069145172 <b>IBAN:</b> MD12TRPCBY518430D0005AA <b>Banca:</b> Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat <b>Cod bancar:</b> TREZMD2X <b>Cod fiscal:</b> 1007609005736

**Semnăturile părților**

<b>FINANȚATOR</b>	<b>BENEFICIAR</b>
Semnătura autorizată:  _____ <b>Doina – Maria Rotaru</b>	Semnătura autorizată:  _____ <b>Vitalie Triboi</b>





## Proiectul

**Profilaxia și prevenirea riscurilor de traumatizare, deces a populației, în special a copiilor și adolescenților ca urmare a accidentelor rutiere**

1.	<p><b>Descrierea problemei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Traumatismul rutier este o problemă majoră a sănătății publice la nivel global. Problema traumatismului rutier la copii și adolescenți și profilaxia lui</b>, atrage atenția specialiștilor din diferite domenii, atât în Republica Moldova, cât și în întreaga lume. <u>Accidentele de trafic rutier la copii și tineri constituie o povară importantă</u> din cauza numărului considerabil de ani de viață pierduți prin deces prematur și de multe ori, prin handicapuri severe pe viață la cei ce au supraviețuit în rezultatul accidentelor. Traumele determinate de accidentele rutiere au cauzat aproximativ 262 mii de decese printre copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 0 și 19 ani, ceea ce constituie 30% din totalul deceselor printre copii.</li> <li>✓ La fiecare caz de deces a unui copil ca rezultat al traumatismului rutier revin câteva sute de copii invalizi ca urmare a traumatismului rutier.</li> <li>✓ Distribuția deceselor din cauza accidentelor rutiere variază în funcție de vârstă și de modul de utilizare a traficului. Majoritatea deceselor care survin din cauza accidentelor rutiere la copiii de 0-14 ani în Regiunea Europeană sunt înregistrate în rândul pietonilor (48%), urmate de cele ale copiilor care sunt pasageri în mașini (32%), cicliști (9%) și motocicliști (6%). Copiii de 15-17 ani vor deceda cu o probabilitate mai mare în accidente de mașină sau m</li> <li>✓ În prezent s-a constatat, că <u>una din principalele cauze ale morbidității, dizabilității și letalității</u> copiilor și adolescenților <u>sunt accidentele</u>, ele constituie circa 22% din totalitatea traumatismelor și accidentelor.</li> <li>✓ Destul de frecvente rămân accidentele rutiere, care constituie 26,25%, ele se întâlnesc mai des la copii de vârsta școlară mică (48,9%) - în special vara. Se produc de 2 ori mai multe accidente pe drumul de reîntoarcere de la școală, decât pe cel de deplasare spre școală, ca urmare probabil a unor condiții favorizante - slăbirea supravegherii, circulația mai intensă, oboseala, nerespectarea regulilor de circulație, etc. Riscul accidentelor rutiere rămâne de 4 ori mai mare în mediul urban decât în cel rural.</li> <li>✓ Accidentele rutiere reprezintă principala cauză a mortalității pentru persoanele de 15-19 ani și a doua cauză pentru cei cu vârsta de peste 4 ani;</li> <li>✓ Traumele provocate copiilor de vehicule au o pondere ne semnificativă de până la 1,5%, cu toate acestea, ele sunt cele mai grave, necesită spitalizare și sunt principala cauză de dizabilitate; Cauza apariției: - Nerespectarea regulilor de circulație atât din partea șoferilor, cât și a pietonilor; - Lăsarea unui copil nesupravegheat pe șosea sau în apropierea acesteia.</li> <li>✓ <b>Cei mai vulnerabili participanți ai traficului sunt pietonii</b>, care sunt supuși riscului de a suporta traumatismul rutier. Rezultatele obținute, urmare a analizei după categoria accidentului rutier, stabilesc că cel mai frecvent pietonii au avut de suferit la traversarea regulamentară a drumului, și aflați pe spațiile destinate circulației acestora. În același timp indicii supuși analizei, prezintă că numărul ridicat al persoanelor decedate în calitate de pietoni, au survenit ca urmare a traversării neregulamentare a drumului.</li> <li>✓ <u>Accidentele rutiere afectează negativ individul, societatea și bugetul de sănătate. Impactul uman al accidentelor rutiere este enorm.</u> Implicații social-economice ale accidentelor rutiere sunt: pierderea de vieți omenești (10 % copii), familii destrămate, copii orfani, pierderea unor personalități de înaltă profesionalitate din știință, artă și cultură, în pregătirea cărora statul a investit sume importante, avarierea autovehiculelor</li> </ul>
----	--

și distrugeri de bunuri materiale, spitalizări și tratamente costisitoare, scoaterea din activitatea de muncă a victimelor, invalidități pe viață;

✓ **Urmările unui accident al unui copil sau adolescent vor fi:**

- Traumatisme suferite;
- Activitățile pe care nu le mai poate face cu prietenii, fiind imobilizat la pat, apoi în convalescență (perioada prin care trece un bolnav după boală, până la însănătoșirea deplină);
- Absențe multiple de la școală;
- Suferința părinților, cheltuieli financiare din bugetul de stat și bugetul familiei;

✓ **Principalele cauze ale accidentelor rutiere:**

- Vitezei inadecvate; condițiilor meteo; infrastructurii rutiere și nerespectării regulilor de circulație (traversarea neregulamentară a străzilor, deplasarea în vehicul fără cuplarea centurii de siguranță, șoferi băuți, drogați sau obosiți șoferi distrați (conduc mâncând sau vorbind la telefon);
- De asemenea o cauză este și vina pietonului (adolescenților) care demonstrează comportament iresponsabil în stradă și consideră că educația rutieră este doar pentru copii mici; E prea încrezut, chiar arogant în stradă și consideră că nu are de ce să fie prudent;
- Vorbește la telefon mobil sau ascultă muzică în căști în timp ce traversează strada;
- Se joacă în preajma străzilor sau chiar pe stradă;
- Nu poartă centura de siguranță când călătorește cu mașina;
- Când se plimbă pe timp întunecat, ploios sau noros nu poartă reflectorizant și are haine de culori închise, astfel devine greu de observat pentru șoferi.

➤ **Principiile cheie care stau la baza activităților în domeniul de informare a populației,** în special a copiilor și adolescenților cu scop de prevenire a traumatismelor ca urmare accidentelor rutiere sunt:

- **Conștientizarea** traficului rutier și a pericolelor acestuia.
- **Comportamentul coresponsuzător** în apropierea străzilor și drumurilor.
- **Efectuarea alegerilor sigure** pentru siguranța personală și a altor persoane.

De ce avem nevoie de educație rutieră?

- Anual pe străzile din toată lumea, decedează peste 1,2 milioane de persoane, iar alte zeci de milioane suferă traumatisme și se alege cu sechele pe viață.
- În medie, peste 500 de copii și tineri de până la 18 ani decedează zilnic pe aceleași străzi ale globului pământesc.
- Astfel accidentele rutiere sunt principalul ucigaș al tinerilor din orice regiune a planetei noastre și Moldova nu este o excepție.

Din aceste motive, **educația rutieră este foarte importantă pentru siguranța în trafic a copiilor și tinerilor.** Niciodată nu este prea devreme să formăm abilități în domeniul siguranței rutiere. Mai cu seamă, copii sunt grupul deosebit de expus la riscul de accidente rutiere pentru că:

- Sunt mai puțin capabili să recunoască pericolele străzii, precum și să ia decizii corecte privind comportamentul lor în stradă;
- Sunt mici de statură, astfel sunt puțin vizibili și greu observați de către conducătorii auto;
- Sunt firavi, motiv pentru care e mai mare probabilitatea să fie răniți în cazul unui accident rutier;

**Este îmbucurător faptul că educația rutieră este un subiect interesant pentru copii și tineri, ușor de digerat și înțeles.** chiar și cel mai mic copil va ști ceva despre siguranța rutieră, deoarece toată lumea se deplasează pe străzi și educația rutieră îi privește pe toți.

- ✓ Conform datelor statistice oficiale ale accidentelor rutiere din Sistemul Informațional „Registrul de Stat al Accidentelor Rutiere” al Inspectoratului National de Securitate Publică pentru o perioadă de 3 ani (2018-2020) s-au distribuit datele demografice, tipul, cauzele, consecințele și distribuția pe regiuni.


- ✓ Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 1988 accidente rutiere, soldate cu 244




decese și 2245 traume.

- ✓ Evoluția situației accidentelor în perioada anilor 2018 - 2020 are un caracter descendent, fiind înregistrată o descreștere cu: 23,9% față de numărul de accidente din traficul rutier, 17,3% față de numărul persoanelor decedate și cu 23,3% față de numărul persoanelor traumatizate.
- Ceea ce ține de raionul Călărași, conform datelor statistice, pe parcursul anului 2022, 41 de persoane au fost implicate în accidente rutiere grave care s-au soldat fie cu decesul persoanelor fie cu traumatisme grave.

Conform Poliției Naționale datele statistice sunt următoarele:

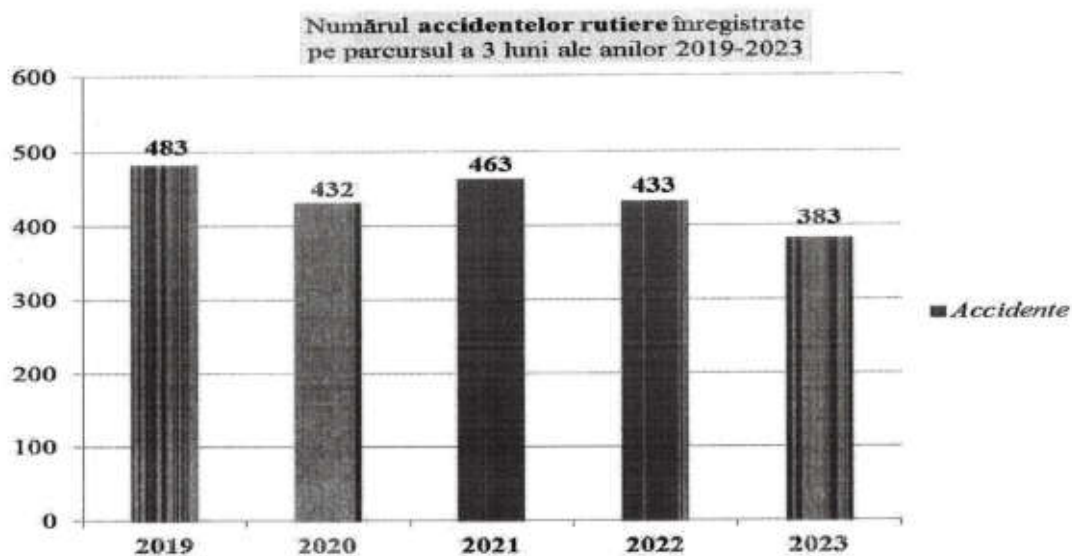

**Numărul persoanelor decedate  
în accidentele rutiere înregistrate  
pe parcursul a 3 luni ale anilor 2019-2023**

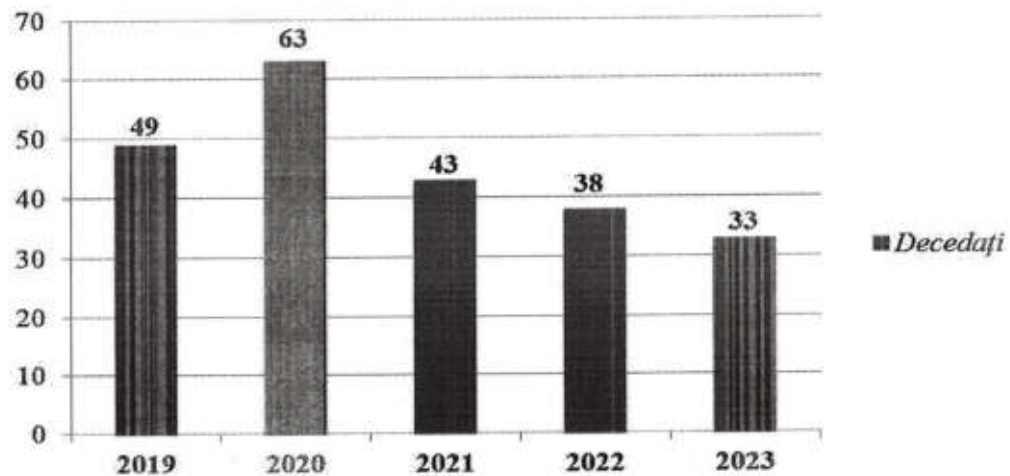

- Pentru a micșora numărul de accidente rutiere și a preveni traumatismul rutier în rândul copiilor și adolescenților este necesar de a organiza campanii pentru educația rutieră, ce ar viza următoarele subiecte:
- să traverseze drumurile publice numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor;
  - să nu se angajeze în traversarea străzii în fugă, prin fața sau prin spatele autovehiculelor staționate ori a mijloacelor de transport public în stații;
  - să respecte culorile semaforului;
  - să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora, numai pe drumușoarele laterale ale drumului public;
  - să circule numai pe partea stângă a drumurilor publice, dacă acestea nu au trotuare sau drumușoare;
  - să coboare din mașină doar pe partea trotuarului;
  - să nu stea pe bordurile trotuarelor, deoarece s-ar putea dezechilibra și cădea în fața mașinilor;
  - să nu permitem copiilor să se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice;
  - să utilizăm dispozitive de siguranță (centura de siguranță, scaunelul auto) la transportarea copiilor în autovehicul.
  - De asemenea și părinții și pedagogii pot proteja copii, învățându-i să respecte regulile de circulație și să urmeze comportamente sigure în stradă. Informarea tinerilor despre riscurile rutiere și despre cum pot fi acestea evitate este important pentru dezvoltarea lor ca membri ai societății.

**2. Scopul general al proiectului**

- Diminuarea cazurilor de accidente rutiere și prevenirea traumatismelor în urma acestora.

**3. Obiectivele generale ale proiectului**

- 01: Sporirea nivelului de responsabilizare a populației în scopul prevenirii traumatismelor la copii și adolescenți prin reducerea cazurilor de accidente rutiere cu implicarea copiilor și adolescenților.
- 02: Adoptarea acțiunilor pozitive a populației din Republica Moldova pentru prevenirea traumatismelor prin reducerea cazurilor de accidente rutiere.



4	<p><b>Obiectivele specifice și activitățile ale proiectului</b></p> <p><b>Obiectivul specific 1 (O1) Sensibilizarea populației prin informarea acesteia, cu privire la metodele de prevenire a traumatismelor ca urmare a accidentelor rutiere.</b></p> <p><b><u>Activitatea 1.1 Masă rotundă pentru prezentarea proiectului.</u></b></p> <p>Acest eveniment va fi desfășurat <u>în luna mai 2023</u> unde vor fi invitate persoane din cadrul Centrului de Sănătate Călărași, Spitalul Raional Călărași, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, reprezentanți din cadrul APL, din cadrul Bibliotecii Publice, Direcția Învățământ Tineret și Sport, Inspectoratul de poliție Călărași.</p> <p>Se va prezenta scopul și obiectivele proiectului dat. La fel se va discuta despre activitățile care urmează a fi implementate în raionul Călărași, pentru a informa populația, în special copiii și adolescenții, cu scop de prevenire a traumatismelor ca urmare a accidentelor rutiere.</p> <p>Fiecare reprezentant va veni cu idei, propuneri și recomandări pentru implicarea calitativă a autorităților, în proiectul dat. Evenimentul dat va dura 2 ore și va fi o pauză de cafea. Produsele vor fi achiziționate din cadrul proiectului. La acest eveniment se preconizează a fi prezente aproximativ 30 de persoane.</p> <p>Locul desfășurării evenimentului se preconizează a fi în incinta IMSP CS Călărași, sala de ședințe, cu contribuție proprie.</p> <p>Produsele alimentare pentru pauza de cafea vor fi achiziționate din sursele financiare din cadrul proiectului, în baza unui contract de achiziție de mică valoare.</p> <p>Va fi întocmită lista cu semnătura fiecărui participant.</p> <p><b><u>Activitatea 1.2 Elaborarea și plasarea spotului video la TV Moldova 1, (1 spot, 4 plasări/zi 50/50)</u></b></p> <p><b><u>Spotul video</u></b> va conține un filmuleț cu implicare a unor actori profesioniști cu mesaj despre prevenirea accidentelor rutiere (sau imagini de scurt metraj, urmat de sonorizare profesională). Se va discuta cu administrația de la canalul TV Moldova 1 și se va achita din cadrul proiectului în baza unui contract de acordare a serviciilor pentru a fi realizat și difuzat 1 spot și 4 plasări/zi pe parcursul a 44 zile, până pe 30 iunie 2023. Astfel cetățenii vor fi încurajați prin acest spot să fie mai atenți, mai indulgenți și cu un grad mai înalt de responsabilitate atunci când sunt participanți la traficul rutier deoarece viața are prioritate. Integritatea corporală și sănătatea prevalează oricărui alt scop sau necesitate. Prin propria prudență și atenție la trafic, fiecare cetățean își aduce aportul la micșorarea numărului traumatismelor și astfel contribuie la reducerea cheltuielilor pentru tratamente.</p> <p>Pe tot parcursul proiectului, va fi difuzat acest spot educativ.</p> <p>Elaborarea filmulețului video va fi efectuat de către profesioniști recomandați de către televiziunea TV Moldova 1.</p> <p>Derularea acestuia va fi repartizată în cadrul acestor 44 de zile, în cadrul orelor zilei, selectate de către angajații respectivi ai TV Moldova 1 cu respectarea cerinței de 4 plasări /zi 50/50.</p> <p>Se preconizează ca spotul video va fi vizionat de către populația Republicii Moldova și a persoanelor din afara țării, care urmăresc televiziunea Moldova 1.</p> <p>Achitarea pentru elaborarea spotului video și plasarea lui va fi efectuată din bugetul proiectului, în baza unor contracte de achiziție de mică valoare.</p> <p><b><u>Activitatea 1.3 Plasări pe rețelele de socializare.</u></b></p> <p>Pe parcursul a 44 zile, sub formă de publicitate se va plasa în rețeaua MMG Moldova, GOOGLE ADWORDS PRICING publicitatea la tema dată. Pentru publicitate se va selecta o porțiune din Spotul video din activitatea 1.2. Elaborarea și derularea acestuia va fi achitată din bugetul proiectului în baza unui contract de achiziție de mică valoare (factură).</p> <p>După fiecare activitate se va realiza o postare pe paginile de socializare a CS Călărași și a CSPT „Vita Longa” unde se vor specifica acțiunile care au avut loc, importanța și impactul acestora asupra populației. La fel, se va plasa și filmulețul realizat și va fi distribuit maxim posibil.</p> <p>Se preconizează ca spotul video va fi distribuit de minim 500 de persoane și va avea un impact de minim 1500 de persoane.</p>
---	--



**Activitatea 1.4 Elaborarea și plasarea spotului audio la postul de radio (TRM Actualități)**

Pe tot parcursul proiectului va fi difuzat un spot audio cu privire la consecințele accidentelor rutiere.

Un număr impunător de persoane au acces la radio și îl ascultă. Cu precădere ascultă conducătorii auto în timpul deplasării, persoanele în vârstă care sunt bunici, persoanele casnice, angajații în drum spre muncă. Spotul audio poate avea un impact asupra acestor categorii de populație pentru a conștientiza valoarea și integritatea vieții, comportamentul conștient și responsabil.

Spotul audio va fi realizat cu suportul persoanelor care activează în cadrul TRM, având un timp de difuzare de un minut cu difuzarea lui de 4 ori pe zi pe parcursul a 44 zile, pe tot parcursul proiectului.

Elaborarea acestuia va fi efectuată de către specialiștii postului Radio Moldova Actualități.

Derularea acestuia va fi achitată din bugetul proiectului în baza unui contract de achiziție de mică valoare.

**Activitatea 1.5 Realizarea și distribuirea pliantelor informative în rândul a 1500 persoane.**

Pentru această activitate se va realiza un model de pliant de către reprezentanți din cadrul Inspectoratului de Poliție Călărași împreună cu reprezentanți din cadrul Centrului de Sănătate Călărași. Acest material informativ va cuprinde informații concise, clare și importante pentru fiecare persoană în parte. Va fi atât pe înțelesul copiilor cât și a adulților despre cum ne putem proteja de accidente rutiere și care este responsabilitatea fiecărui cetățean. Ne propunem să fie tipărite 1500 de pliante și distribuite în orașul Călărași de către voluntarii din cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor Călărași. Atât în luna mai cât și în luna iunie se preconizează a fi realizată această activitate.

Cheltuielile pentru tipărirea materialelor informative vor fi susținute din cadrul proiectului

**Activitatea 1.6 Realizarea unui Flash-mob cu genericul „Fii atent la drum - cineva drag te așteaptă acasă”**

Această activitate va fi desfășurată la data de 26 mai 2023 cu participarea a 30 de elevi din instituțiile educaționale din orașul Călărași și voluntarii din cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Vita Longa”. Acest flash-mob va fi desfășurat în scuarul Primăriei din orașul Călărași. Adolescenții vor aduce un mesaj important tuturor cetățenilor cu privire la importanța securității vieții. Mesajul primordial va fi: „**Fii atent la drum - cineva drag te așteaptă acasă**”. Mesajul va fi proiectat pe un panou din PVC, cu care cei 30 participanți vor efectua acțiunea. Panourile vor fi achiziționate din bugetul proiectului în baza unui contract de achiziție de mică valoare.

Adolescenții vor fi echipați cu veste fluorescente care vor fi achiziționate din bugetul proiectului în baza unui contract de achiziție de mică valoare.

Inițial activitatea se va începe cu distribuirea a circa 300 pliante la locuitorii or. Călărași, care în acel moment se vor afla în locurile publice ale or. Călărași.

Pliantele vor fi tipărite și achitate din bugetul proiectului în baza unui contract de achiziție de mică valoare.

După petrecerea activității, participanții vor fi conduși la Inspectoratul de Poliție Călărași, unde vor vizita „Camera memoriei” (Muzeul IP Călărași) pentru o mică excursie și un angajat al poliției rutiere Călărași va aduce careva date privind securitatea la trafic întru evitarea traumatismelor.

Evenimentul dat va dura 2,5 ore și va fi organizată o pauză de cafea. Produsele vor fi achiziționate din cadrul proiectului. La acest eveniment se preconizează a fi prezente aproximativ 30 de persoane.

Fiecărui participant la activitate se va înmâna câte o agendă personalizată cu mesajul primordial: „**Fii atent la drum - cineva drag te așteaptă acasă**”.

Va fi întocmită lista participanților.

Vestele fluorescente, în număr de 30 bucăți și panourile PVC, în număr de 15 bucăți vor fi luate la evidența contabilă și se vor păstra și utiliza în alte activități de către CSPT „Vita Longa”.

**Activitatea 1.7 Plasări pe billboard**

Pentru această activitate ne-am propus ca pe teritoriul Primăriei din orașul Călărași, să fie plasată informație pe billboard (consolă) iar pe teritoriul IMSP CS Călărași și a Centrului Multifuncțional Călărași să fie plasate doua standuri portabile cu dimensiunile de 1,2 X 0,85 metri, cu referire la prevenirea accidentelor rutiere și a traumatismelor în urma acestora. Va fi stipulat faptul că siguranța în trafic este primordială. În aceste instituții se deplasează multe persoane astfel încât vor fi informate și vor aborda această dificultate din alt punct de vedere, pozitiv.

Procurarea, transportarea, instalarea, tipărirea billboardului (consolei), vor fi achitate din bugetul proiectului.

**Activitatea 1.8 Plasări pe ecrane TV, instalate în locuri publice.**

În cadrul acestei activități, se va prezenta video-ul pe ecranele TV ale instituțiilor publice din orașul Călărași, precum ASP, CS, 3 instituții de învățământ, Primăria Călărași, Spitalul Raional Călărași, IP Călărași, Judecătoria Strășeni cu sediul în Călărași, CSPT „Vita Longa”. Acest video va dura aproximativ 30 secunde și va fi derulat de 3 ori pe zi.

În prealabil, un reprezentant CS Călărași, va discuta cu administrația acestor instituții publice și va coordona derularea video-urilor. Astfel, această activitate are ca scop informarea cetățenilor prin prisma filmulețului dat. S-a preconizat ca anume în aceste instituții să deruleze video, deoarece este un flux mare de persoane, atât adulți cât și copii care se pot informa și preveni situațiile defavorabile a accidentelor rutiere.

Pentru această activitate se preconizează a fi procurate 10 flash-uri, din cadrul proiectului, pentru a putea distribui filmulețul în fiecare instituție nominalizată.

**Activitatea 1.9 Publicarea a trei articole informative în ziarul regional „Expresul”**

La începutul proiectului vom publica un articol care va conține informații cu privire la demararea proiectului și care sunt scopurile și acțiunile acestuia.

Un al doilea articol va fi publicat după realizarea activităților „Siguranța micului pieton” pentru a specifica importanța respectării regulilor circulației rutiere inclusiv și de micii pietoni și de maturi.

Al treilea articol va fi publicat după realizarea activităților pentru a specifica care a fost impactul proiectului asupra populației și care sunt acțiunile ulterioare planificate.

Elaborarea și publicarea acestora vor fi achitate din bugetul proiectului.

**Obiectivul specific 2 (O2) Dezvoltarea și implementarea orelor informative centrate pe copii și elevi pentru a preveni traumatismele ca urmare a accidentelor rutiere.**

**Activitatea 2.1 Organizarea orelor informative pentru elevii din mediul educațional cu privire la modalitățile de prevenire a traumatismelor ca urmare a accidentelor rutiere**

La această activitate se preconizează pentru luna mai și iunie de a fi realizate ore informative în cadrul Liceului teoretic „M. Sadoveanu” din orașul Călărași, pentru clasele V-IX, Liceului teoretic „V. Alecsandri” la fel pentru clasele V-IX, gimnaziul „I. Creangă”, clasele V-IX, și Școala Profesională Călărași, elevii claselor X-XII. Aceste ore vor fi realizate de către specialiștii din cadrul Centrului de sănătate prietenos tinerilor „Vita Longa” (coordonator de voluntari, psiholog, asistent social) și reprezentanți din partea Inspectoratului de Poliție Călărași, medici din IMSP CS Călărași.

Aproximativ 400 de elevi, clasele V-XII vor fi informați despre metodele de prevenire ale accidentelor rutiere, consecințele unor astfel de cazuri și importanța deținerii de informații veridice pentru a putea conștientiza riscurile.

Fiecare persoană instruită va primi o mapă cu pix, caiet de notițe și materialul succint al informației din PPT, imprimat pe foi A4 (3-4 file).

În cadrul acestor ore se vor distribui materiale informative atât elevilor cât și cadrelor didactice.

Birotica va fi achiziționată din cadrul proiectului. La acest eveniment se preconizează a fi prezente aproximativ 400 de persoane.



**Activitatea 2.2 Realizarea activităților de informare prin Joc de rol „Siguranța micului pieton”, la nivel de instituții de educație timpurie din orașul Călărași.**

În cadrul activității date, cel puțin doi reprezentanți din cadrul IP Călărași împreună cu specialiști din cadrul CSPT „Vita Longa”, vor realiza Joc de rol împreună cu copiii din grupele pregătitoare, din cadrul grădinițelor din orașul Călărași. Activitatea dată prevede acțiuni în care copiii vor fi pietonii iar voluntarii din cadrul CSPT „Vita Longa” și specialiștii, vor avea rol de dirijori ai circulației și participanți la trafic. Astfel, li se va demonstra copiilor cum să acționeze în traficul rutier, ce acțiuni pot întreprinde atât ei cât și părinții acestora pentru a nu fi supuși anumitor riscuri. Totodată, va fi demonstrat cu ajutorul tuturor materialelor, echipamentelor indispensabile (trecere de pietoni, bastoane, veste fluorescente, etc.) cum se pot proteja de eventuale accidente rutiere. Vor fi instruiți aproximativ 141 de copii dintre care 31 copii din IET „Doremicii” din orașul Călărași, 55 copii din IET „Lăstărel” și 55 copii din IET „Guguță”.

În total un număr de 31 de veste fluorescente vor fi achiziționate din cadrul bugetului proiectului după care vor fi înregistrate la balanța Centrului de Sănătate Călărași ca ulterior să fie utilizate pentru activități de același gen cu copiii.

Trecerea de pietoni v-a fi confecționată din panou de PVC, care va fi achiziționată din cadrul bugetului proiectului după care va fi înregistrată la balanța Centrului de Sănătate Prietenoasă Tinerilor „Vita Longa”, Călărași, ca ulterior să fie utilizată pentru activități de același gen cu copiii

La final de activitate, fiecare copil va primi câte o diplomă de participare. Cheltuielile pentru aceste diplome vor fi asigurate din proiectul dat.

**Activitatea 2.3: Realizarea unei expoziții de desen cu tematica: „Suntem atenți și prudenți în traficul rutier”**

În urma jocului tematic, organizat cu copii din grupele pregătitoare ale grădinițelor și a orelor informative susținute pentru elevi, în perioada iunie – mai se v-a demara un concurs de desene cu genericul: „Suntem atenți și prudenți în traficul rutier”. După prezentarea și acumularea desenelor se v-a organiza o expoziție. Careva cerințe specifice pentru desen nu se vor înainta, cu excepția respectării tematicii. Participanții vor avea libera alegere la executare. Fiecărui participant la expoziție i se va acorda diplomă de participare.


Se preconizează ca în cadrul expoziției de desene vor participa cel puțin 50 de elevi din instituțiile educaționale din raionul Călărași. Expoziția va fi expusă în cadrul Centrul de Sănătate Prietenoasă Tinerilor „Vita Longa”, în perioada 30.06.2023 - 31.07.2023.

Se vor realiza liste ale participanților din cadrul acestei activități.

**5. Planul de acțiuni al proiectului**

<i>Activitatea</i>	<i>mai</i>	<i>iunie</i>
<b>Activitatea 1.1</b> Masă rotundă pentru prezentarea proiectului.		
<b>Activitatea 1.2</b> Elaborarea și plasarea spotului video la TV Moldova 1, (1 spot, 4 plasări/zi 50/50)		
<b>Activitatea 1.3</b> Plasări pe rețelele de socializare.		
<b>Activitatea 1.4</b> Elaborarea și plasarea spotului audio la postul de radio (TRM Actualități)		
<b>Activitatea 1.5</b> Realizarea unui Flash-mob cu genericul „Fii atent la drum-cineva drag te așteaptă acasă”		
<b>Activitatea 1.6</b> Realizarea și distribuirea pliantelor informative în rândul a 1500 persoane.		
<b>Activitate 1.7</b> Plasări pe billboard		
<b>Activitate 1.8</b> Plasări pe ecrane Tv, instalate în locuri publice.		
<b>Activitate 1.9</b> Publicarea a trei articole informative în ziarul regional ”Expresul”.		
<b>Activitatea 2.1</b> Organizarea orelor informative pentru elevii din mediul		





	<p>educațional cu privire la modalitățile de prevenire a traumatismelor ca urmare a accidentelor rutiere.</p> <p><b>Activitatea 2.2</b> Realizarea activităților de informare prin Joc de rol "Siguranța micului pieton", la nivel de instituții de educație timpurie din orașul Călărași.</p> <p><b>Activitatea 2.3</b> Realizarea unei expoziții de desen cu tematica: "Suntem atenți și prudenți în traficul rutier".</p>		
<b>6.</b>	<p><b>Beneficiari direcți și indirecti ai proiectului</b>  <b>Beneficiarii direcți</b> ai proiectului vor fi aproximativ 141 copii și 350 adolescenți.  <b>Beneficiarii indirecti</b> vor fi persoanele din întreaga comunitate din raionul Călărași și nu doar, deoarece plasările video-urilor și a postărilor se vor realiza la nivel de țară, drept beneficiari indirecti vor fi întreaga populație din Republica Moldova</p>		
<b>7.</b>	<p><b>Monitorizarea, evaluarea și raportarea implementării proiectului</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pe parcursul proiectului se vor realiza postări pentru vizibilitate pe paginile de socializare a Centrului de Sănătate Călărași, CSPT „Vita Longa”, Inspectoratul de Poliție Călărași, Biblioteca Publică Călărași, pentru a observa care este impactul produs asupra populației prin prisma activităților organizate.</li> <li>✓ Raportarea implementării proiectului dat se va realiza prin prezentarea rapoartelor financiare și narrative.</li> <li>➤ Evaluarea proiectului se va efectua pe tot parcursul implementării proiectului de comun cu CNAM.</li> </ul>		
<b>8. Cofinanțare</b>			
1. Proiectul prevede cofinanțare?			
<b>DA</b>			<b>X</b>
<b>NU</b>			
2. Indicați propria cofinanțare din bugetul total al proiectului (în lei și în %)			<b>20000,0 lei/ 10,1 %</b>
	Nume, prenume,	Triboi Vitalie, șef IMSP CS Călărași	
	Semnătura	<i>Triboi</i>	
	Ștampila		

la Contractul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## Bugetul de cheltuieli al proiectului

Denumirea cheltuielilor	Unitate	Numărul de unități	Cost unitate (lei)	Suma totală pe proiect (lei)	inclusiv:	
					din sursele Finanțatorului	din sursele Beneficiarului
<b>CHELTUIELI, total</b>				<b>214.640,00</b>	<b>194.640,00</b>	<b>20.000,00</b>
inclusiv:						
<b>1. Cheltuieli de personal, total</b>				<b>38.722,00</b>	<b>38.722,00</b>	
inclusiv:						
<b>1.1 Cheltuieli directe de personal</b>				<b>17.426,00</b>	<b>17.426,00</b>	
Tatarciuc Ionela, psiholog CSPT	pers.	1	5.202,00	5.202,00	5.202,00	
Iosob Cătălina, coordonator de voluntari CSPT	pers.	1	5.202,00	5.202,00	5.202,00	
Tataru Lina, șef CSPT „Vita-Longa”	pers.	1	7.022,00	7.022,00	7.022,00	
<b>1.2 Cheltuieli indirecte de personal</b>				<b>21.296,00</b>	<b>21.296,00</b>	
Manager de proiect, Triboi Vitalie șef CS	pers.	1	10.007,00	10.007,00	10.007,00	
Contabil șef, Gonțear Svetlana	pers.	1	6.122,00	6.122,00	6.122,00	
Economist, Lipcanu Taisia	pers.	1	5.167,00	5.167,00	5.167,00	
<b>2. Bunuri și servicii, total</b>				<b>175.918,00</b>	<b>155.918,00</b>	<b>20.000,00</b>
inclusiv:						
<b>2.1 Servicii de locațiune</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>2.2 Servicii de transport</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>2.3 Publicitate și promovare</b>				<b>124.296,00</b>	<b>124.296,00</b>	
elaborarea spotului video	buc	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
difuzarea spotului video la postul TV Moldova 1 (88 minute câte 4 plasări pe zi 50/50)	buc	1	43.440,00	43.440,00	43.440,00	
plasarea spotului video în rețeaua MMG Moldova GOOGLE ADWORDS	luna	1,5	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
elaborarea spotului audio	buc	1	500,00	500,00	500,00	
plasarea spotului audio la postul de radio TV Moldova actualități 4 plasări pe zi 50/50)	buc	1	22.364,00	22.364,00	22.364,00	
elaborarea și publicarea articolelor informative pentru ziarul regional „Expresul”	unități	3	2.500,00	7.500,00	7.500,00	
plasari pe Billbord (panou informativ; panou PVC; Stend AO 1,25x085; transport; panou PCT 1m.p.)	buc	1	25.392,00	25.392,00	25.392,00	
plasari pe ecranele TV	unități	10	150,00	1.500,00	1.500,00	
<b>2.4 Servicii editoriale</b>	<b>unități</b>	<b>1500</b>	<b>5,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>2.5 Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou</b>				<b>24.122,00</b>	<b>24.122,00</b>	
birotica		x	x	7000,00	7000,00	
agendă personalizată	buc	30	150,00	4500,00	4500,00	
diplome	buc	191	7,00	1337,00	1337,00	
sticuri	buc	10	150,00	1500,00	1500,00	
vestă reflectorizantă pentru copii	buc	31	65,00	2015,00	2015,00	
vestă reflectorizantă pentru maturi	buc	30	59,00	1770,00	1770,00	
cheltuieli pentru pauza de cafea				6000,00	6000,00	

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	
Doina - Maria Rotaru	Vitalie Triboi



la Contractul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**GRAFICUL TRANȘELOR ȘI PREZENTĂRII RAPOARTELOR**

(lei)

Nr. d/o	Tipul cheltuielilor	Total	I tranșă (mai - iunie)
			1.
2.	Bunuri și servicii	155.918,00	155.918,00
<b>Suma totală, lei</b>		<b>194.640,00</b>	<b>194.640,00</b>
Termen de prezentare a rapoartelor			10.07.2023

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
  <b>Doina - Maria Rotaru</b>	  <b>Vitalie Triboi</b>





la Contractul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Declarație pe propria răspundere**

Subsemnat/a Trîbei Vitelie, domiciliată în orașul Călărași, str. Bejole, 45/38 în calitate de conducător al IMSP CJ Călărași, fiind în relații contractuale cu Compania Națională de Asigurări în Medicină în baza Contractului de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire nr. 05/02 - 07/11 din 15.05.23, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.351<sup>1</sup> din Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul în declarații, că documentele, rapoartele, informațiile menționate în listele beneficiarilor de servicii prestate în cadrul contractului prenotat sînt veridice.

15.05.23

(data)

Trîbei

(semnătura)

la Contractul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Raport financiar al beneficiarului: \_\_\_\_\_

Perioada de realizare a proiectului : \_\_\_\_\_

Perioada de raportare: \_\_\_\_\_

Denumirea proiectului: \_\_\_\_\_

## Raport financiar generalizat

(lei)

1	Tipul de cheltuielilor	Bugetul aprobat			Finanțat CNAM	Cheltuieli efective			Devieri	
		Total	inclusiv:			Total	inclusiv:		cheltuieli efective CNAM/ aprobat CNAM	cheltuieli efective CNAM/ finanțat CNAM
			CNAM	surse proprii			CNAM	surse proprii		
2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-4	11=8-6	
	<b>Total:</b>									

Conducător \_\_\_\_\_

Contabil \_\_\_\_\_

L.Ș.

la Contractul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Raport pe cheltuieli al beneficiarului:**

Perioada de raportare: \_\_\_\_\_  
 Denumirea proiectului: \_\_\_\_\_  
 Suma totală a bugetului: \_\_\_\_\_

**Raport financiar detaliat**

Linia de buget	Plata		Documente financiare confirmative			Suma totală pe proiect (lei)	inclusiv:	
	Data efectuării plății	Nr. doc. de plată (ordin sau dispoziție)	Denumirea, nr. și data documentului	Vinzătorul de mărfuri / servicii/ destinatarul plății	Descrierea mărfurilor, serviciilor / destinația plății		din contul CNAM	din surse proprii
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>1. Cheltuieli de personal</b>								
1.1								
1.2								
						<b>TOTAL 1. Cheltuieli de personal</b>		
<b>2. Bunuri și servicii</b>								
2.1								
2.2								
						<b>TOTAL 2. Bunuri și servicii</b>		
<b>TOTAL GENERAL:</b>								

Conducător \_\_\_\_\_

Contabil \_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_



## RAPORT NARATIV FINAL DE ACTIVITATE

Acest raport final de activitate este perfectat și prezentat Finanțatorului (CNAM) la finele finalizării proiectului, conform termenelor limită indicate în contractul de finanțare. Raportul prezintă un sumar al rezultatelor implementării activităților planificate în cadrul finanțării respective. Necompletarea unei părți a raportului, nedepunerea lui în formatul și timpul stabiliți poate rezulta în rambursarea totală sau parțială a sumelor virate Beneficiarului.

### A. Date despre proiect

#### Data prezentării raportului

#### Informații privind Beneficiarul

Persoana de contact și funcția:

Adresa:

Telefon/Fax:

E-mail :

#### Echipa de implementare

Coordonator/ Managerul proiectului (Numele și prenumele):

#### Beneficiari:

Grupul țintă/Beneficiarii direcți

Beneficiarii indirecti

#### Denumirea proiectului:

Scopul:

Obiective:

Perioada de implementare și acoperirea geografică a proiectului:

Contract de finanțare nr.: \_\_\_\_\_ semnat la data de .....

Bugetul conform contractului de finanțare:

### B. Date privind rezultatele implementării proiectului

#### Descriere succintă a proiectului

**Modul de implementare a proiectului.** Descrieți modul în care a fost implementat proiectul. Descrieți progresul efectuat în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse și a activităților încheiate în perioada de derulare a proiectului (*conform* planului de activități din propunerile de proiect).

**Atingerea obiectivelor proiectului.** Descrieți care obiective nu au fost atinse din cele planificate și explicați cauzele.

**Activități realizate versus planificate.** Descrieți care activități nu au fost realizate din cele planificate și expuneți cauzele neimplementării.

**Rezultatele obținute.** Descrieți cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative (indicatori de performanță, efecte sociale, etc.).

**Realizarea indicatorilor.** Includeți numărul de beneficiari planificați pentru atingere și acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului și rezultatele la finalizarea proiectului. Specificați dacă implementarea proiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geografică.

**Impactul.** Descrieți impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastră. Care au fost schimbările concrete produse în urma realizării proiectului? Descrieți impactul activității asupra beneficiarilor/participanților.

**Schimbări față de bugetul aprobat.** Specificați diferențele de realizare în raport cu planificarea inițială. În cazul în care ați întâmpinat dificultăți la capitolul dat, expuneți problemele apărute pe parcursul implementării proiectului și cum au fost depășite.

**Monitorizarea și evaluarea/ metode de evaluare a succesului/rezultatelor.** Descrieți modul în care s-a realizat monitorizarea și evaluarea implementării proiectului. Recomandări – cheie urmare implementării activităților proiectului.

**Cooperare cu alți parteneri, APC, APL.** Descrieți implicarea organizațiilor partenere, inclusiv a fondurilor primite din alte surse (tehnici folosite, eficiența, beneficiul organizației). Indicați volumul finanțării suplimentare oferite de alți donatori.

**Executarea bugetului proiectului.** Descrieți cum ați cheltuit mijloacele financiare primite în cadrul implementării proiectului.

Conducătorul:  
Ștampila:
